


Chantier participatif

BILAN CHANTIER PHASE 3




**Centre des Feuilles Vives
& L'AMC**

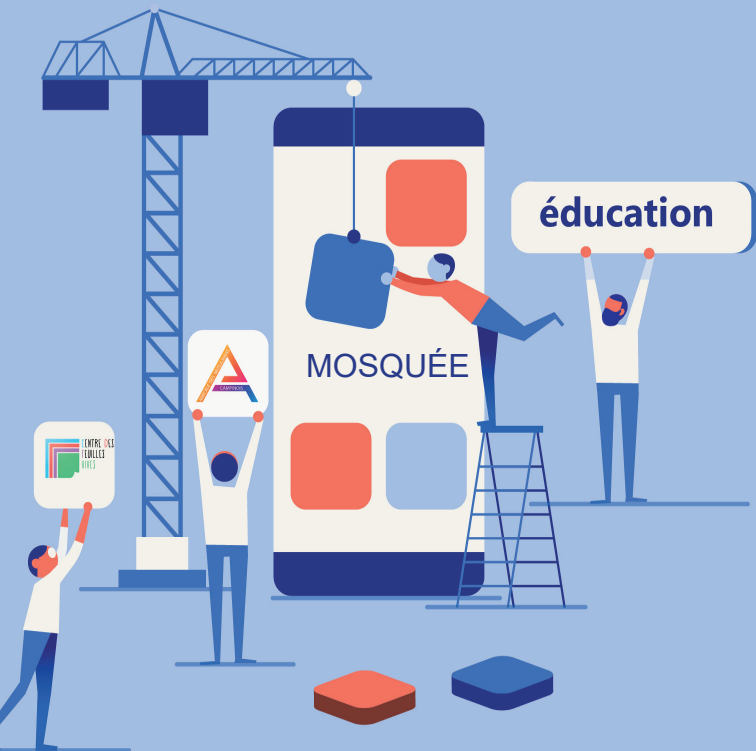

DATE : DU 22 JANV AU 06 MAR 2024
NATURE DES TRAVAUX :

- Préparation poutres métalliques
- Ouverture et pose donnant sur le toit du bâtiment arrière
- Assemblage ossature métallique





1-Préparation poutres métalliques



Concernant l'ossature métallique, nous avons opté par le biais d'une société de métallurgie d'acheter toutes les poutres indiquées sur le rapport du bureau d'étude, afin cette société se charge de la préparation des poutres avant l'assemblage.

- Soudure des plaques et platines
- découpage des poutres
- préparation des trous pour les boulons

Cette organisation est beaucoup plus économique que de passer par une entreprise.






2-Ouverture et pose donnant sur le toit du bâtiment arrière



Nous avons créé un accès direct sur le toit arrière du bâtiment afin de préparer la pose de l'ossature métallique.






3-Assemblage ossature métallique



Etape la plus cruciale la pose de l'ossature métallique.
Nous avons plusieurs contraintes, le poids et la longueur des poutres de 3 mètres à plus de 6 m de long et entre 100 et 650 kg.





La pose de l'ossature s'est effectué en 2 étapes :

1. En transportant les poutres à la main à l'aide de chariot, nous avons besoin entre 6 à 20 bénévoles selon les poutres. Ensuite par un système de mini grue que notre équipe de métallurgie ont ingénieusement conçu, par la grâce d'Allah. Nous avons pu assembler 60 % de l'ossature.
2. Ensuite le reste de la pose s'est effectué par une grande grue mobile que la société ATM, qu'Allah les récompense pleinement, nous a livré gratuitement.

Pour que cela se fasse nous du bloquer la rue Eugène varlin, pendant 4 à 5 heures.





4-Cout des travaux


Ossature	17 000 €
Main d'œuvre	6 500 €
Materiel divers	5 050,72€

= 23 550,72 €



Coût restant previsionnel des travaux*

110 000 € - 42 750,72 € = 67 249,28 €



* Le cout previsionnel peut subir des variations.



5-Prochaines phases de travaux*

➔ Mois de mars 2024 :

- Pose plancher OSB
- Pose Murs OSB autour de l'ossature
- Pose toiture

➔ Vacances avril 2024 :

- Dépose escalier métallique
- Fondation futur escalier colimaçon
- Isolation intérieur et pose BA13

➔ Juillet 2024 :

- Peinture intérieur
- Isolation extérieur et bardage
- pose électricité-luminaire
- pose lino

➔ Aout 2024 :

- Pose escalier colimaçon
- Aménagement de la cour de récréation
- Pose carrelage entrée école privée
- Finition escalier entrée école
- Finition peinture mosquée

* Le planning peut être amené à être changé





9-Rappel besoins

On vous rappelle notre opération 50,
au 12/03/2024 nous avons atteint la somme de 39480 €
en promesse.
25030 € ont été donné.


Il manque encore 10 520 € en promesse
afin d'atteindre la somme de 50 000 €

http://centredesfeuillesvives.fr/wp-content/uploads/2024/01/Formulaire-operation_50.pdf

D'après 'Abdallah Ibn 'Abbas (qu'Allah les agrée lui et son père) : Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) était le plus généreux des hommes et la période durant laquelle il était le plus généreux était le Ramadan lorsque Jibril le rencontrait.

Jibril le rencontrait chaque nuit de Ramadan et ils étudiaient ensemble le Coran. Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) était alors plus généreux pour le bien que le vent envoyé (*).

(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°3554 et Mouslim dans son Sahih n°2308)



Formulaire Adhésion
Opération 50
Scannez ou cliquez



Brochure explicative
du projet d'agrandissement
Scannez ou cliquez





Qu'Allah récompense la totalité des bénévoles qui ont participé à cette 3ème tranche de travaux.

Cela nous a permis de réduire fortement les coûts.

Qu'Allah récompense tous ceux qui ont aidé au niveau de toutes les étapes de cette 3ème tranche.

Vous nous avez apporté beaucoup de soutien à travers vos du3as, vos aides logistiques, manuelles et financières.

