

# Chantier participatif

BILAN CHANTIER PHASE 4



**Centre des Feuilles Vives**  
& L'AMC



DATE : DU 08 AVR AU 21 AVR 2024  
NATURE DES TRAVAUX :

- Finition montage ossature métallique
- Pose OSB plancher
- Pose OSB murs ossature
- Pose toiture ossature
- Coulage fondation espalier métallique
- Flocage de l'ossature métallique





# 1-Finition montage ossature métallique



Cette 4ème étape nous a permis au départ d'effectuer les finitions concernant l'assemblage de l'ossature métallique.

- Pose des profilé C qui serviront de support pour la toiture, murs, fenêtres et portes.





## 2-Pose OSB plancher & Pose OSB murs ossature




Nous avons pu ensuite poser les plaques OSB de 20 mm d'épaisseur afin de constituer la coque de l'ossature et le plancher de ce nouvel espace.




### 3-Pose toiture ossature



Nous avons opté ensuite concernant le type de toiture pour des panneaux sandwichs en bac acier de 7,60 m de long avec une épaisseur en mousse de 10 cm.

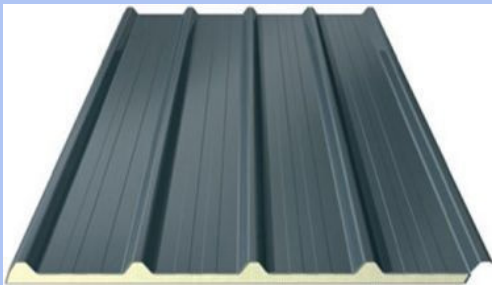

## 4-Coulage fondation escalier mé-

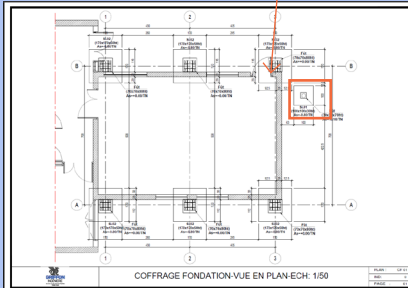

Nous avons finalisé cette 4ème étape par le coulage de la fondation du futur escalier colimaçon.



## 5-Flocage de l'ossature métallique



La résistance au feu de l'ossature métallique est moins performante que le béton ou le bois afin de remédier à cela un flocage coupe feu a été effectué sur l'ossature métallique.





## 5-Cout des travaux

### Cout des travaux phase 4 :

Finition ossature	3 000 €
Main d'œuvre	4000 €
Toiture	6 000 €
Matériel divers	4 598,9 €

= 17 598,9 €

Prévisonnel total (A)	110 000 €
Dépenses Totales(B)	59784,05€
restant (A-B) prévisionnel	50 215,95 €



\* Le cout prévisionnel peut subir des variations.





## 5-Prochaines phases de travaux\*

On vous rappelle que ce planning reste un prévisionnel et que des changements seront opérés au fur et à mesure



mois de mai-juin 2024 :

- Fondation futur escalier colimaçon
- Isolation intérieur et pose BA13
- pose plafonds suspendu
- pose de tout le câblage électrique
- pose de la tuyauterie évacuation eaux



Juillet 2024 :

- Peinture intérieur
- Isolation extérieur et bardage
- pose électricité-luminaire
- pose lino



Aout 2024 :

- Pose escalier colimaçon
- Aménagement de la cour de récréation
- Pose carrelage entrée école privée
- Finition escalier entrée école
- Finition peinture mosquée



\* Le planning peut être amené à être changé



## 9-Rappel besoins



On vous rappelle notre opération 50, au 12/03/2024 nous avons atteint la somme de 54 761 € en don réel.

De là nous avons dépassé min fadli Allah, notre objectif de 50 000 €. Mieux encore in cha Allah, nous attendons encore plus de 10 000 € de promesse, qui sont en attente de remboursement .

Cela nous permettra de terminer la dernière phase de travaux, prévu cet été, avec plus de facilité et profitez sans doute si aucun imprévu sur le budget prévisionnel des travaux

ne vienne, pour étendre l'aménagement et la maintenance du bâtiment.

Vous serez informés in cha Allah de cela.





Montant récolté au total	114 000 €
montant dépensés	59 784,04 €
montant restant	54 215,96 €

Qu'Allah récompense la totalité des bénévoles qui ont participé à cette 4ème tranche de travaux.

Cela nous a permis de réduire fortement les coûts.

Qu'Allah récompense tous ceux qui ont aidé au niveau de toutes les étapes de cette seconde tranche.

Vous nous avez apporté beaucoup de soutien à travers vos du3as, vos aides logistiques, manuelles et financières.

